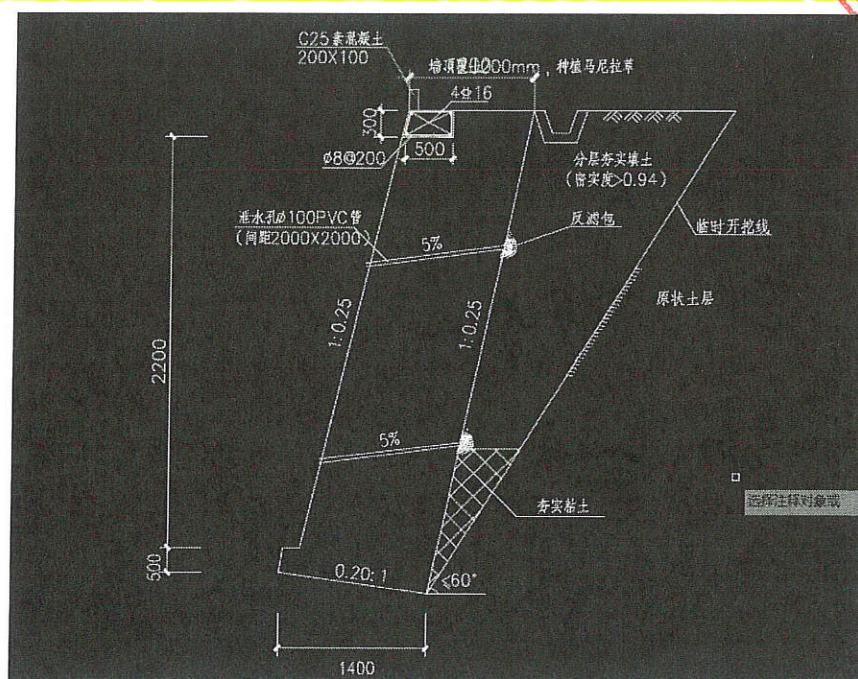
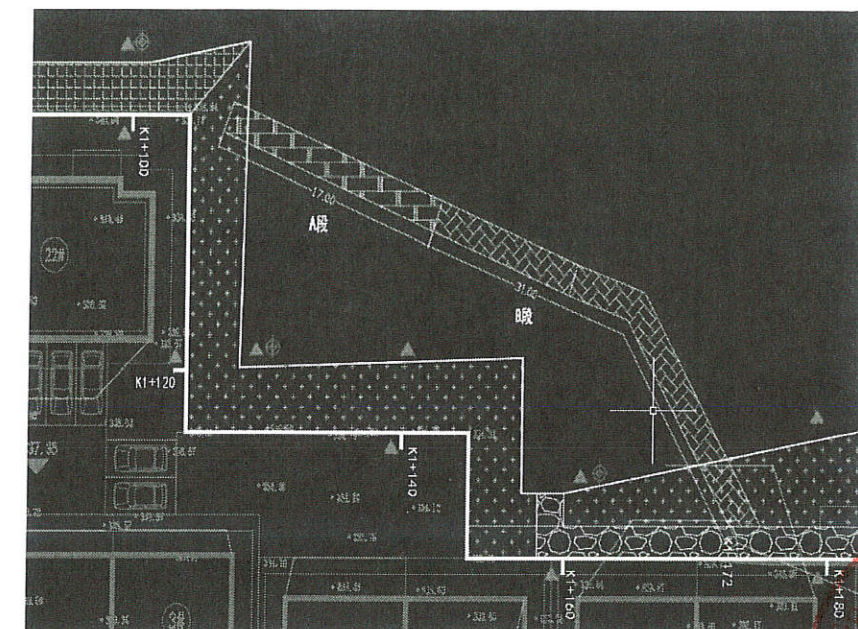


工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	
致：福州海福建设监理咨询有限公司 事由：关于填方区截排水沟增设混凝土垫层的事宜。 内容： 由我司负责承建的白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程。在图纸会审中建议对填方区截排水沟增设 C15 混凝土垫层，经各参建单位协商一致，同意在填方区域的截排水沟增设 10cm 厚 C15 混凝土垫层，恳请相关单位予以确认，为谢！ 施工单位： 项目经理： 日期：2024年5月12日			
监理单位意见：  总 监： 日期：2024年5月12日 			
设计单位意见：  设计代表： 日期：2024年5月12日 			
建设单位意见： 建设单位代表： 日期：2024年5月12日 			


工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	
致：福州海福建设监理咨询有限公司 事由：关于 K1+108-K1+160 段变更的事宜。 内容： 1、 K1+108-K1+160 段原设计为自然放坡。现场实际挡墙位置和自然放坡位置与征地位置不相符，根据业主要求此段挡墙位置需按现场实际征地位置施工；自然放坡段取消并增加浆砌毛石挡墙，具体做法及挡墙标高等按 K1+160-K1+180 段施工。 以上事项恳请相关单位予以确认为谢！ 施工单位： 项目经理：陈群 日期：2024年10月21日			
监理单位意见： 情况属实，予以确认。 总监：王可群 日期：2024年10月21日 			
设计单位意见： 同意 设计单位代表：陈刚 日期：2024年10月21日 			
建设单位意见：同意 建设单位代表：陈金群 日期：2024年10月21日 			








增加浆砌毛石挡墙




工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	BG003
致：福州海福建设监理咨询有限公司 事由：关于 K3 挡墙 K3+017.5-K3+040 段设计标高调整的事宜。 内容： 白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程由我司负责承建。现场在 K3 挡墙 K3+017.5 段-K3+040 段开挖完成后，经设计、地勘、监理、业主现场验槽确认持力层符合要求，实际地质墙踵线标高为 326.2 米，该高程低于原设计标高 327.2 米；考虑挡墙质量安全问题，我司建议 K3 挡墙 K3+017.5 段-K3+040 段现场按照 C 型大样样式施工，是否可行？恳请相关单位予以确认，为谢！ 施工单位： 项目经理：陈明峰 日期：2024年5月14日			
监理单位意见： 情况属实，予以确认。 总监：王同旺 日期：2024年5月14日			
设计单位意见： 同意 设计代表：陈明峰 日期：2024年5月14日			
建设单位意见： 同意 建设单位代表：陈明峰 日期：2024年5月14日			

工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	BG006
致：福州海福建设监理咨询有限公司 事由：关于 K3+040-K3+053.5 段挡墙型式调整的事宜。 内容： 由我司负责承建的白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程。在 K3 挡墙 K3+040-K3+053.5 段基槽开挖完成后，经设计、地勘、监理、业主现场验槽确认持力层符合要求后，实际墙踵线标高为 326.3 米，低于原设计墙踵线标高 327.5-328.5 米；考虑挡墙质量安全问题，我司建议 K3 挡墙 K3+040-K3+053.5 段按照 C 型挡土墙大样图施工，是否可行？恳请相关单位予以确认，为谢！			
施工单位： 项目经理： 日期：2024 年 6 月 21 日			
监理单位意见：  总监：  日期：2024 年 6 月 21 日			
设计单位意见：  设计代表：  日期：2024 年 6 月 21 日			
建设单位意见： 建设单位代表：  日期：2024 年 6 月 21 日			


工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	BG007
致：福州海福建设监理咨询有限公司 事由：关于 K3+053.5-K3+085.3 段挡墙设计标高调整的事宜。 内容： 由我司负责承建的白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程。在 K3 挡墙 K3+053.5-K3+085.3 段基槽开挖完成后，经设计、地勘、监理、业主现场验槽确认持力层符合要求后，实际墙踵线标高为 326.6 米，低于原设计墙踵线标高 328.5-329.2 米；考虑挡墙质量安全问题，我司建议 K3 挡墙 K3+053.5-K3+085.3 段按照 FDB5 型挡土墙大样图施工，是否可行？恳请相关单位予以确认，为谢！			
		施工单位： 项目经理： 日期：2024年6月23日	
监理单位意见： 		总监： 日期：2024年6月23日	
设计单位意见： 		设计代表： 日期：2024年6月23日	
建设单位意见：		建设单位代表： 日期：2024年6月23日	

工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	
致：福州海福建设监理咨询有限公司 事由：关于 K3+085.3-K3+104 段挡墙设计标高调整的事宜。 内容： 由我司负责承建的白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程。在 K3 挡墙 K3+085.3-K3+104 段基槽开挖完成后，经设计、地勘、监理、业主现场验槽确认持力层符合要求后，实际墙踵线标高为 327.6 米，低于原设计墙踵线标高 328.5-326.8 米；考虑挡墙质量安全问题，我司建议 K3 挡墙 K3+085.3-K3+104 段按照 FDB4.5 型挡土墙大样图施工，是否可行？恳请相关单位予以确认，为谢！			
施工单位：福州旭丰建设有限公司 项目经理：陈伟群 日期：2024年6月15日			
监理单位意见： 同意设计变更，予以确认。总监：王同胜 日期：2024年6月15日			
设计单位意见： 同意 设计代表：陈伟群 日期：2024年6月15日			
建设单位意见：同意 建设单位代表：陈伟群 日期：2024年6月15日			

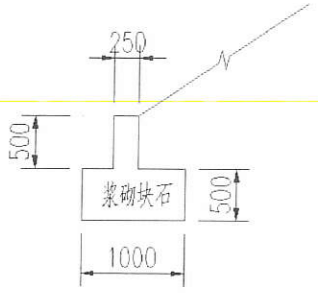


工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	BG008
致：福州海福建设监理咨询有限公司 事由：关于 K3+104-K3+118 段挡墙设计标高调整的事宜。 内容： 白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程由我司负责承建。在 K3 挡墙 K3+104-K3+118 开挖完成后，经设计、地勘、监理、业主共同现场验槽确认持力层符合要求后，实际墙踵线标高为 325.1 米，低于原设计墙踵线标高 326.1 米；考虑挡墙质量安全问题，我司建议 K3 挡墙 K3+104-K3+122 段在挡墙基础下 1 米范围内，采用浆砌片石换填至经验槽后符合设计持力层的土层，换填宽度按挡墙基础宽度两侧各加 20 厘米，是否可行？恳请相关单位予以确认，为谢！			
施工单位： 项目经理： 日期：2024 年 06 月 25 日			
监理单位意见：  总监： 日期：2024 年 6 月 25 日 			
设计单位意见：  设计代表： 日期：2024 年 6 月 25 日 			
建设单位意见： 建设单位代表： 日期：2024 年 6 月 25 日 			


工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	BG009
致：福州海福建设监理咨询有限公司 事由：关于 K3+180-K3+224 段挡墙设计基底高程下换填浆砌处石的事宜。 内容： 白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程由我司负责承建。现场在 K3 挡墙 K3+180-K3+224 段开挖完成后，经设计、地勘、监理、业主现场验槽确认持力层符合要求后，实际基槽底标高为 318.30 米，设计墙踵线标高 318.8 米以下为换填素砼，后经各方现场查看研究决定，原应换填的素砼变更为换填浆砌片石，换填厚度为 50 厘米，换填剖面宽度为挡土墙基础宽度两侧各加 20 厘米，并请相关单位出具变更图，相应工程量计入工程竣工结算，恳请相关单位予以确认，为谢！ 施工单位：[Red Stamp: 福州海福建设监理咨询有限公司 35030510020110001722] 项目经理：[Signature] 日期：2024 年 7 月 7 日			
监理单位意见： [Signature] 总 监：[Signature] 日期：2024 年 7 月 7 日 [Red Stamp: 福州海福建设监理咨询有限公司 35030510020110001722]			
设计单位意见： [Signature] 设计代表：[Signature] 日期：2024 年 7 月 7 日 [Red Stamp: 福州海福建设监理咨询有限公司 35030510020110001722]			
建设单位意见：[Signature] 建设单位代表：[Signature] 日期：2024 年 7 月 7 日 [Red Stamp: 福州海福建设监理咨询有限公司 35030510020110001722]			

工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	BG010
致：福州海福建设监理咨询有限公司 中合一工程设计有限公司 莆田市凤洋幸福家园建设发展有限公司 事由：关于 K3+118-K3+158 段增设自然放坡坡脚挡土埂的事宜。 内容： 白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程由我司负责承建。在 K3+140-180 段原设计为填方自然放坡，应业主要求，为了防止该范围内填方边坡土方流失，在自然放坡坡脚处增设浆砌片石挡土埂（断面尺寸如下图），具体增加工程量根据现场施工长度按实签证，相应工程量计入工程竣工结算，恳请相关单位予以确认，为谢！  微型挡土埂断面图 单位: mm 施工单位： 项目经理：  日期： 2024 年 7 月 15 日			
监理单位意见：  总监：  日期： 2024 年 7 月 15 日			
设计单位意见：  设计代表：  日期： 2024 年 7 月 15 日			
建设单位意见：   建设单位代表：  日期： 2024 年 7 月 15 日			

工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	
致：福州海福建设监理咨询有限公司 事由：关于 K1+180-K1+210 挡墙的相关事宜。 内容： 由我司负责承建的白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程。现已在 K1+180-K1+210 段过程。为节省工程造价，经各参建单位现场实地踏勘，协商同意，应建设单位要求同意该段基础采用 C25 片石混凝土浇筑墙身采用 M10 浆砌毛石挡墙，该相关事宜，恳请相关单位予以确认，为谢！ 施工单位： 项目经理： 日期：2024年5月19日			
监理单位意见：  总监： 日期：2024年5月19日 			
设计单位意见：  设计单位代表： 日期：2024年5月19日 			
建设单位意见： 建设单位代表： 日期：2024年5月19日 			

工作联系单

工程名称

白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程

编号

HC011

致：福州海福建设监理咨询有限公司

事由：关于 K1+65-K1+105 框架梁预应力锚索段无法按图施工的事宜。

内容：

由我司负责承建的白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程。K1+65-K1+105 段原设计为框架梁预应力锚索，红线位置为现场实际征地位置，因业主征地困难，现场无法按设计图纸放坡超出红线。经设计、业主、监理、地勘、施工各方共同现场勘查确认边坡土质为碎块状强风化花岗岩，应业主要求按现场实际边坡位置施工需变更施工方案，建议变更为毛石混凝土挡墙。烦请相关单位出具变更方案，以便我司尽快组织施工，以免影响工期。为谢！

施工单位：

项目经理：

日期：

监理单位意见：

情况属实，请予以确认。

总监：

日期：

勘察单位意见：

勘察单位代表：

日期：

设计单位意见：

设计变更合理，同意。

设计单位代表：

日期：

建设单位意见：

同意。

建设单位代表：

日期：

工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	BG011
------	-----------------------------	----	-------

致：福州海福建设监理咨询有限公司

事由：关于 K1+65-K1+105 框架梁预应力锚索段无法按图施工的事宜。

内容：

由我司负责承建的白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程。K1+65-K1+105 段原设计为框架梁预应力锚索，红线位置为现场实际征地位置，因业主征地困难，现场无法按设计图纸放坡超出红线。经设计、业主、监理、地勘、施工各方共同现场勘查确认边坡土质为碎块状强风化花岗岩，应业主要求按现场实际边坡位置施工需变更施工方案，建议变更为毛石混凝土挡墙。烦请相关单位出具变更方案，以便我司尽快组织施工，以免影响工期。为谢！

施工单位：

项目经理：

日期：

监理单位意见：

情况属实，请予以确认。

总监：

日期：

勘察单位意见：

勘察单位代表：

日期：

设计单位意见：

设计修改同意

设计单位代表：

日期：




建设单位意见：

同意

建设单位代表：

日期：

工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	
致：福州海福建设监理咨询有限公司 事由：关于 K1+000-K1+025.8 段变更的事宜。 内容： 由我司负责承建的白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程。在 K1+000—K1+025.8 段原设计为从红线位置向红线外围自然放坡，现场实际红线位置为业主实际征地位置。经各参建单位现场实地踏勘，边坡土质为碎块状强风化，因业主向红线外围征地困难，应业主要求，将原设计 K1+000-K1+025.8 为放坡植草变更为 K1+000-K1+018.6 浆砌毛石挡墙按照 D 型大样样式施工及 K1+018.6-K1+025.8 段变更为毛石混凝土挡墙参照 HJA9.5 型施工。恳请相关单位予以确认并出具相关变更方案，为谢！			
施工单位： 项目经理： 日期：2024年8月7日		 	
监理单位意见： 		总监： 日期：2024年8月7日	
设计单位意见： 		设计单位代表： 日期：2024年8月8日	
建设单位意见： 		建设单位代表： 日期：2024年8月8日	

工作联系单

工程名称	白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程	编号	
------	-----------------------------	----	--

致：福州海福建设监理咨询有限公司
 事由：关于 K2 挡墙自然放坡段坡底排水沟事宜。
 内容：

白洋村“幸福家园”新建区（一期）用地红线挡墙和护坡工程由我司承建，K2 挡墙自然放坡段坡脚原设计有排水沟，现场实际排水沟位置业主未与村民征地完成，导致目前该排水管暂无法施工。经与业主协商排水沟暂不施工，待后续业主征地完成后另行委托其他单位按原设计要求施工。

恳请相关单位予以确认，为谢！

施工单位：
 项目经理：
 日期：2022年10月17日

监理单位意见：

情况属实，予以确认。
 总监：
 日期：2022年10月17日

设计单位意见：

同意，征地完成后按原设计施工。
 设计单位代表：
 日期：2022年10月17日

建设单位意见：同意

建设单位代表：
 日期：2022年10月17日
